Многофункциональный гостиничный комплекс (курортного типа, 5 звезд), мыс Бурный, г.Владивосток

Название	Начало	Окончание
Строительство гостиниц на материковой части г.Владивостока	**10.08.2009**	**30.04.2013**
Многофункциональный гостиничный комплекс (курортного типа,5 *)	**10.08.2009**	**30.04.2013**
Начало	10.08.2009	10.08.2009
Окончание	02.04.2013	02.04.2013
Земельный участок	**10.08.2009**	**01.04.2013**
Утверждение на град. плане	10.08.2009	30.10.2012
Аренда земельного участка	01.04.2010	01.04.2013
Организационные мероприятия	**10.08.2009**	**05.12.2012**
Заключение договора на ген. проектирование	10.08.2009	18.09.2009
Выбор гостиничного оператора	10.08.2009	14.08.2009
Проведение конкурса и заключение госконтракта на строительство	11.01.2010	01.04.2010
Заключение договора технического консультирования	06.07.2010	31.03.2011
Получение разрешения на строительство	29.11.2012	05.12.2012
Проектные работы и экспертиза проекта	**18.09.2009**	**03.12.2012**
Стадия А - Предпроект	**18.09.2009**	**02.11.2009**
Разработка архитектурной концепции	18.09.2009	12.10.2009
Согласование Архитектурной концепции	12.10.2009	02.11.2009
Инженерно- изыскательские работы	**08.11.2009**	**30.08.2010**
Инженерно- изыскательские работы	08.11.2009	30.08.2010
Стадия П- Проект	**02.11.2009**	**17.09.2010**
Плитно-свайный фундамент	28.01.2010	31.03.2010
Объемно планировочные решения	02.11.2009	17.09.2010
Сети канализации	09.06.2010	30.08.2010
Наружные сети	17.03.2010	19.05.2010
Берегоукрепление	01.03.2010	31.05.2010
Сети электроснабжения	01.03.2010	31.08.2010
Временное электроснабжение	01.03.2010	30.06.2010
Водовод	07.04.2010	27.07.2010
Тепловые сети	23.07.2010	16.09.2010
Экспертиза	**20.05.2010**	**03.12.2012**
Экспертиза проектной документации	20.05.2010	19.11.2012
Экспертиза сметной документации	15.07.2010	03.12.2012
Рабочая документация и сопровождение	**01.04.2010**	**16.04.2012**
Стадия РД-Рабочая документация	**01.04.2010**	**29.04.2011**
Берегоукрепление	01.06.2010	31.12.2010
Плитно свайный фундамент	01.04.2010	19.05.2010
Наружные сети	20.05.2010	20.09.2010
Конструктивные и объемно планировочные решения	01.04.2010	29.04.2011
КМ наружные	01.10.2010	29.04.2011
Временное электроснабжение	22.11.2010	28.12.2010
Водоподготовка бассейнов	24.05.2010	29.04.2011
Стадия С - Тендерная документация	**10.04.2010**	**26.05.2010**
Подготовка Тендерной документации	10.04.2010	26.05.2010
Стадия D- Авторское сопровождение Рабочей док-ции	**01.05.2010**	**16.04.2012**
Корректировка архитектурно-планировочных решений	01.05.2010	16.04.2012
Дизайн-проект	**01.12.2010**	**16.04.2012**
Разработка Дизайн-проекта	01.12.2010	16.04.2012
Ландшафтный дизайн	**10.01.2011**	**31.12.2011**
Ландшафтный дизайн	10.01.2011	31.12.2011
Строительно-монтажные работы по объекту	**01.02.2010**	**01.04.2013**
Организационные затраты	**15.02.2010**	**01.04.2013**
Содержание заказчика	15.02.2010	01.04.2013
Услуги технического заказчика	**01.02.2010**	**01.04.2013**
Техническое консультирование	01.02.2010	01.04.2013
Подготовка территории строительства	**10.02.2010**	**28.06.2010**
Подготовка территории строительства	10.02.2010	28.06.2010
Содержание строительной площадки	**01.02.2010**	**30.03.2011**
Содержание строительной площадки	01.02.2010	30.03.2011
Генподрядчик	**01.02.2010**	**01.04.2013**
Подготовительные работы	**13.07.2010**	**16.04.2012**
Гидротехническое сооружение	**13.07.2010**	**16.04.2012**
Частичная отсыпка акватории с укреплением	13.07.2010	30.11.2010
Водолазное обследование	13.07.2010	30.11.2010
Устройство пирса	12.08.2011	16.04.2012
Вынос кабеля связи	**01.04.2011**	**30.08.2011**
Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею	01.04.2011	24.08.2011
Протаскивание конца кабеля в береговой колодец	01.04.2011	30.08.2011
Разработка грунта вручную	01.04.2011	24.08.2011
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	01.04.2011	30.08.2011
Укладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах	01.04.2011	24.08.2011
Монтаж муфт концевых эпоксидных	01.04.2011	14.06.2011
Монтаж муфт концевых из пластмассового корпуса	01.04.2011	14.06.2011
Засыпка вручную траншей	01.04.2011	24.08.2011
Устройство ввода труб в колодцы	01.04.2011	14.06.2011
Устройство колец опорных ОК-1	01.04.2011	14.06.2011
Установка кронштейна в колодцах	01.04.2011	14.06.2011
Установка люка в колодцах	01.04.2011	14.06.2011
Устройство колодца проходного и углового	01.04.2011	14.06.2011
Монтаж конструкций металлических кабельных	01.04.2011	25.08.2011
Общестроительные работы	**01.02.2010**	**22.03.2013**
Земляные работы	**10.02.2010**	**27.04.2010**
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами	10.02.2010	21.02.2010
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м	10.02.2010	15.02.2010
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами	10.02.2010	04.03.2010
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м	10.02.2010	21.02.2010
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	22.02.2010	27.03.2010
Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами	23.02.2010	17.03.2010
Работа на отвале, группа грунтов 2-3	17.03.2010	27.04.2010
Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	17.03.2010	22.03.2010
Фундаментная плита	**01.02.2010**	**27.05.2010**
Щебеночное основание	**12.03.2010**	**04.04.2010**
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами	12.03.2010	03.04.2010
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м	12.03.2010	03.04.2010
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 40-70 мм	12.03.2010	14.03.2010
Уплотнение грунта прицепными катками	12.03.2010	03.04.2010
На каждый последующий проход по одному	12.03.2010	03.04.2010
Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	03.04.2010	04.04.2010
Гидроизоляция	**05.04.2010**	**10.04.2010**
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	05.04.2010	10.04.2010
Обратная засыпка	**10.04.2010**	**24.04.2010**
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами	10.04.2010	24.04.2010
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м	10.04.2010	21.04.2010
Бетонная подготовка	**01.04.2010**	**30.04.2010**
Устройство бетонной подготовки	01.04.2010	30.04.2010
Устройство монолитной плиты	**01.02.2010**	**27.05.2010**
Монолитная плита ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ (на отм. -4,60 в осях 31-53, А-Г)	**12.03.2010**	**25.04.2010**
Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками	12.03.2010	25.04.2010
Установка закладных деталей весом до 4 кг	12.03.2010	17.03.2010
Сборка и сварка каркасов и сеток пространственных	12.03.2010	12.04.2010
Покупка материалов	**12.03.2010**	**15.04.2010**
Бетон гидротехнический	12.03.2010	11.04.2010
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 32-40 мм	12.03.2010	11.04.2010
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм	12.03.2010	14.04.2010
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	12.03.2010	23.03.2010
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	12.03.2010	12.04.2010
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	12.03.2010	13.03.2010
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	12.03.2010	15.04.2010
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	12.03.2010	16.03.2010
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	12.03.2010	15.04.2010
Плита монолитная на отм. -4,60 КОНФЕРЕН-ЗАЛ (в осях 41-53, Г2-И2)	**01.02.2010**	**27.04.2010**
Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками	01.04.2010	27.04.2010
Бетон гидротехнический	01.04.2010	27.04.2010
Покупка материалов	**01.02.2010**	**31.03.2010**
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм	01.02.2010	31.03.2010
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	01.02.2010	31.03.2010
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	01.02.2010	31.03.2010
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	01.02.2010	31.03.2010
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	01.02.2010	31.03.2010
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	01.02.2010	31.03.2010
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	01.02.2010	31.03.2010
Сборка и сварка каркасов и сеток плоских диаметром 25-28 мм	01.02.2010	31.03.2010
Плита монолитная на отм. -4,60 СПА КОМПЛЕКС (в осях 3-20, А-И)	**01.03.2010**	**27.05.2010**

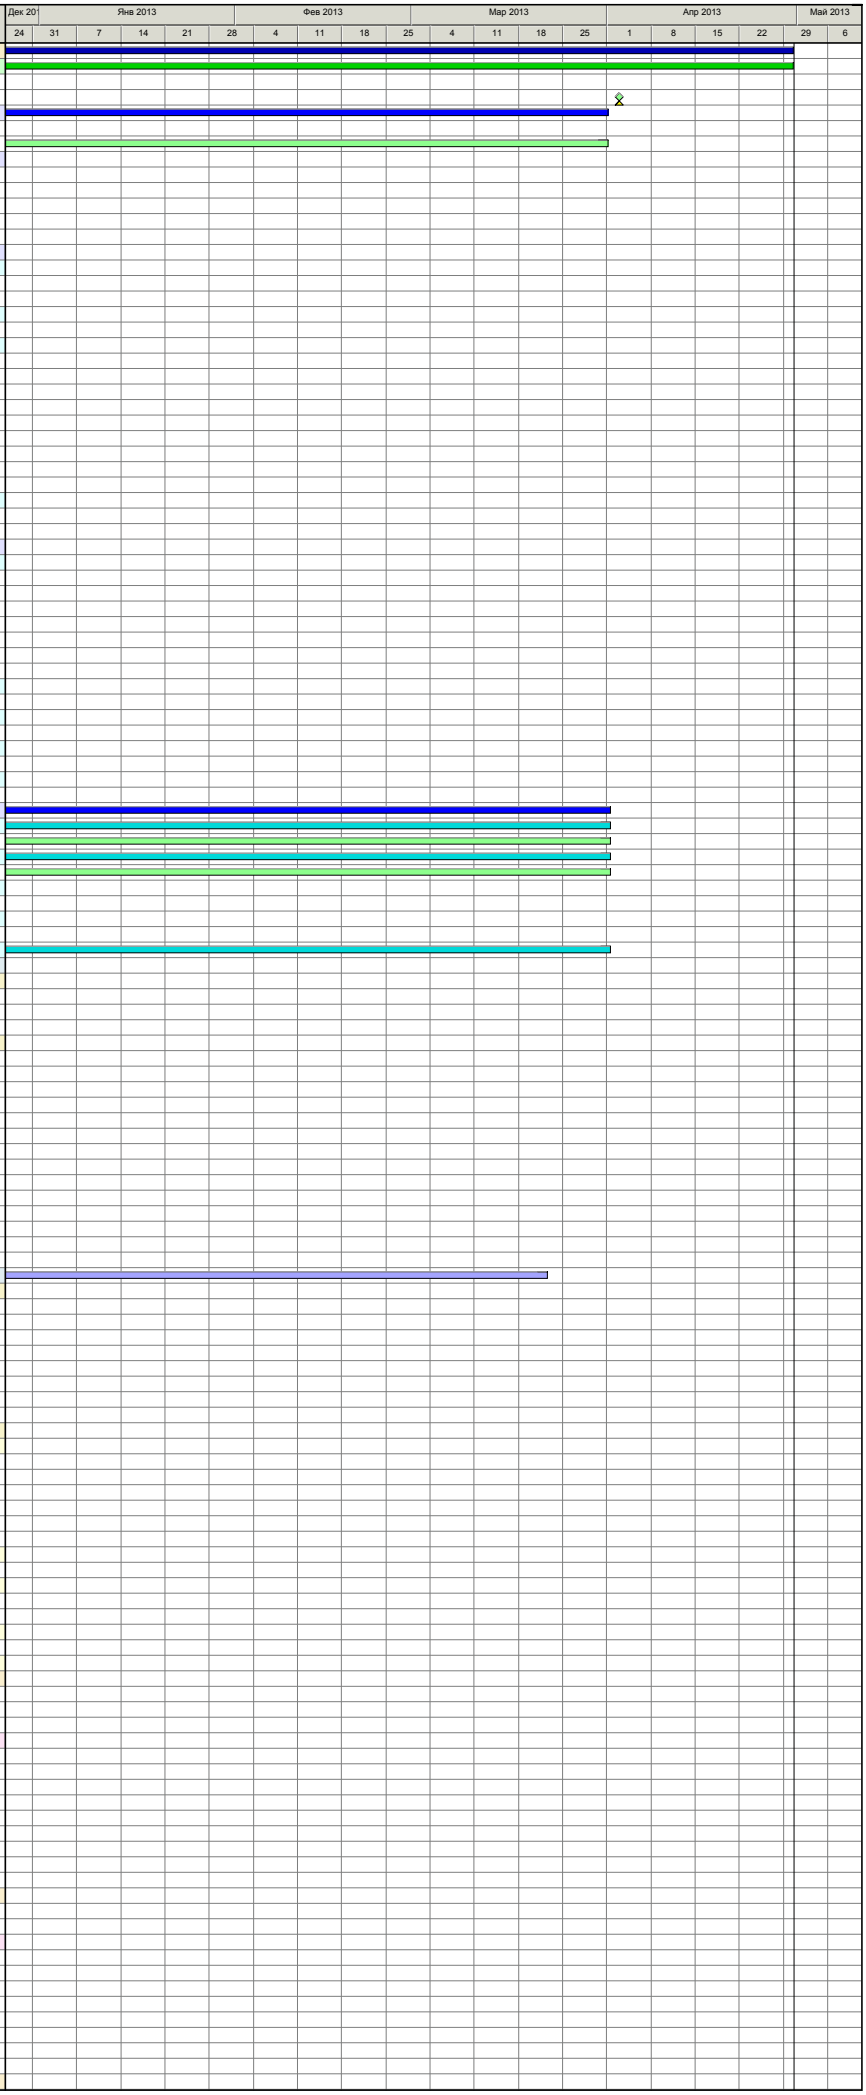

Название	Начало	Окончание
Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками	01.05.2010	27.05.2010
Бетон гидротехнический	01.05.2010	27.05.2010
Покупка материалов	**01.03.2010**	**30.04.2010**
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III диаметром 25-28 мм	01.03.2010	30.04.2010
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III диаметром 20-22 мм	01.03.2010	30.04.2010
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III диаметром 16-18 мм	01.03.2010	30.04.2010
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III диаметром 14 мм	01.03.2010	30.04.2010
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III диаметром 12 мм	01.03.2010	30.04.2010
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III диаметром 10 мм	01.03.2010	30.04.2010
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 10 мм	01.03.2010	30.04.2010
Сборка и сварка каркасов и сеток плоских диаметром 25-28 мм	01.03.2010	30.04.2010
Устройство каркаса зданий, отделочные работы и мебелировка	**25.04.2010**	**22.03.2013**
Здание гостиницы	**25.04.2010**	**20.03.2013**
Этаж на отметке -4.600	**25.04.2010**	**20.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	25.04.2010	03.06.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	25.04.2010	02.06.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	25.04.2010	26.04.2010
Устройство лестничных маршей	25.04.2010	17.05.2010
Отделочные работы	**08.11.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	08.11.2012	15.01.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**15.01.2013**	**15.03.2013**
Мебелировка	15.01.2013	15.03.2013
Этаж на отметке -0.150	**21.05.2010**	**20.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	21.05.2010	28.06.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	21.05.2010	28.06.2010
Устройство перекрытий	21.05.2010	29.06.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	21.05.2010	22.05.2010
Устройство лестничных маршей	21.05.2010	09.07.2010
Отделочные работы	**08.11.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	08.11.2012	15.01.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**15.01.2013**	**15.03.2013**
Мебелировка	15.01.2013	15.03.2013
Этаж на отметке +4.050	**04.06.2010**	**20.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	04.06.2010	29.06.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	04.06.2010	29.06.2010
Устройство перекрытий	04.06.2010	29.06.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	04.06.2010	05.06.2010
Устройство лестничных маршей	04.06.2010	03.07.2010
Отделочные работы	**08.11.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	08.11.2012	15.01.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**15.01.2013**	**15.03.2013**
Мебелировка	15.01.2013	15.03.2013
Этаж на отметке +8.250	**16.06.2010**	**20.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	16.06.2010	10.07.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	16.06.2010	10.07.2010
Устройство перекрытий	16.06.2010	10.07.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	16.06.2010	16.06.2010
Устройство лестничных маршей	16.06.2010	10.07.2010
Отделочные работы	**08.11.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	08.11.2012	15.01.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**15.01.2013**	**15.03.2013**
Мебелировка	15.01.2013	15.03.2013
Этаж на отметке +12.450	**29.06.2010**	**20.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	29.06.2010	03.08.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	29.06.2010	03.08.2010
Устройство перекрытий	29.06.2010	03.08.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	29.06.2010	20.07.2010
Устройство лестничных маршей	29.06.2010	04.08.2010
Отделочные работы	**08.11.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	08.11.2012	15.01.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**15.01.2013**	**15.03.2013**
Мебелировка	15.01.2013	15.03.2013
Этаж на отметке +16.050	**12.07.2010**	**20.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	12.07.2010	05.08.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	12.07.2010	05.08.2010
Устройство перекрытий	12.07.2010	05.08.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	12.07.2010	05.08.2010
Устройство лестничных маршей	12.07.2010	05.08.2010
Отделочные работы	**08.11.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	08.11.2012	15.01.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**15.01.2013**	**15.03.2013**
Мебелировка	15.01.2013	15.03.2013
Этаж на отметке +19.650	**24.07.2010**	**20.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	24.07.2010	16.08.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	24.07.2010	16.08.2010
Устройство перекрытий	24.07.2010	16.08.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	24.07.2010	17.08.2010
Устройство лестничных маршей	24.07.2010	17.08.2010
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
6/F (KA,KB&TR 13 rms) Installation	**06.09.2012**	**17.11.2012**
Установка мрамора и мозаики	06.09.2012	09.09.2012
Установка ванного каркаса и ванной	15.09.2012	20.09.2012
Мраморная отделка пола	18.09.2012	23.09.2012
Установка деревянного ламбрекена	16.09.2012	19.09.2012
Установка встроенной мебели, панели	21.09.2012	02.10.2012
Установка дверной рамы и панели	03.10.2012	12.10.2012
Установка мрамора на ванный каркас	11.10.2012	16.10.2012
Завершение зашивки инженерных систем	12.10.2012	12.10.2012
Установка гипсокартонного потолка	13.10.2012	20.10.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	21.10.2012	30.10.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	31.10.2012	06.11.2012
Ковровое покрытие	05.11.2012	12.11.2012
Установка штор	10.11.2012	14.11.2012
Установка санитарного оборудования	09.11.2012	17.11.2012
Handover of room ons 6/F (KC&KD 3rms)	**12.10.2012**	**25.11.2012**
Установка швеллера для стеклянной кабины	12.10.2012	14.10.2012
Установка потолочной рамы	12.10.2012	16.10.2012
Установка мрамора и мозаики	15.10.2012	24.10.2012
Установка ванного каркаса и ванной	20.10.2012	25.10.2012
Мраморная отделка пола	25.10.2012	29.10.2012
Установка деревянного ламбрекена	23.10.2012	26.10.2012
Установка встроенной мебели, панели	27.10.2012	05.11.2012
Установка дверной рамы и панели	06.11.2012	10.11.2012
Установка мрамора на ванный каркас	08.11.2012	12.11.2012
Завершение зашивки инженерных систем	01.11.2012	01.11.2012
Установка гипсокартонного потолка	02.11.2012	07.11.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	08.11.2012	17.11.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	18.11.2012	22.11.2012
Ковровое покрытие	16.11.2012	21.11.2012
Установка штор	20.11.2012	23.11.2012
Установка санитарного оборудования	19.11.2012	25.11.2012
Handover of room ons 6/F (DK 3rms)	**12.10.2012**	**25.11.2012**
Установка швеллера для стеклянной кабины	12.10.2012	14.10.2012
Установка потолочной рамы	12.10.2012	16.10.2012
Установка мрамора и мозаики	15.10.2012	24.10.2012
Установка ванного каркаса и ванной	20.10.2012	25.10.2012
Мраморная отделка пола	25.10.2012	29.10.2012
Установка деревянного ламбрекена	23.10.2012	26.10.2012
Установка встроенной мебели, панели	27.10.2012	05.11.2012
Установка дверной рамы и панели	06.11.2012	10.11.2012
Установка мрамора на ванный каркас	08.11.2012	12.11.2012
Завершение зашивки инженерных систем	01.11.2012	01.11.2012
Установка гипсокартонного потолка	02.11.2012	07.11.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	08.11.2012	17.11.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	18.11.2012	22.11.2012
Ковровое покрытие	16.11.2012	21.11.2012
Установка штор	20.11.2012	23.11.2012
Установка санитарного оборудования	19.11.2012	25.11.2012

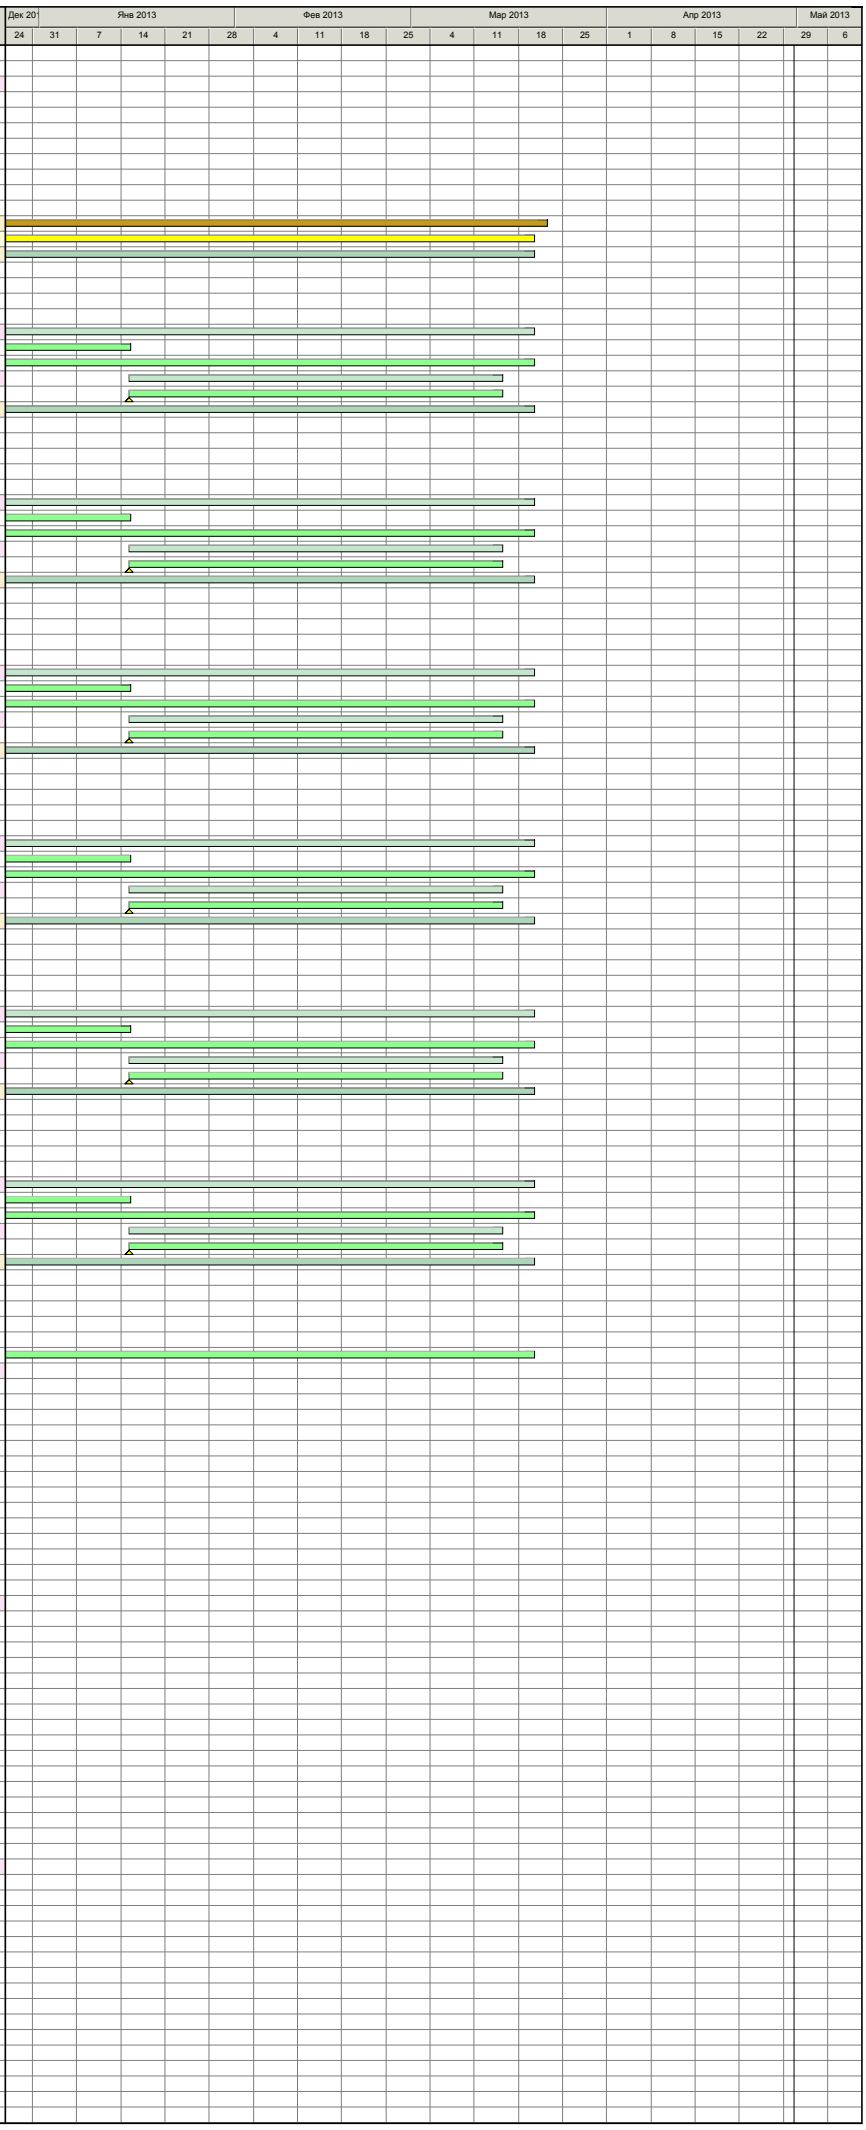

Название	Начало	Окончание
Мебелировка	**26.11.2012**	**31.01.2013**
Мебелировка	26.11.2012	31.01.2013
Этаж на отметке +23.250	**06.08.2010**	**20.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	06.08.2010	02.09.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	06.08.2010	01.09.2010
Устройство перекрытий	06.08.2010	01.09.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	06.08.2010	27.08.2010
Устройство лестничных маршей	06.08.2010	06.09.2010
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
7/F (KA,KB&TR 13 rms) Installation	**06.09.2012**	**14.11.2012**
Мраморная отделка пола	06.09.2012	11.09.2012
Установка деревянного ламбрекена	11.09.2012	14.09.2012
Установка встроенной мебели, панели	18.09.2012	29.09.2012
Установка дверной рамы и панели	30.09.2012	09.10.2012
Установка мрамора на ванный каркас	08.10.2012	13.10.2012
Завершение зашивки инженерных систем	09.10.2012	09.10.2012
Установка гипсокартонного потолка	10.10.2012	17.10.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	18.10.2012	27.10.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	28.10.2012	03.11.2012
Ковровое покрытие	02.11.2012	09.11.2012
Установка штор	07.11.2012	11.11.2012
Установка санитарного оборудования	06.11.2012	14.11.2012
Handover of room ons 7/F (KC&KD 3rms)	**06.10.2012**	**20.11.2012**
Установка швеллера для стеклянной кабины	06.10.2012	08.10.2012
Установка потолочной рамы	06.10.2012	10.10.2012
Установка мрамора и мозаики	09.10.2012	18.10.2012
Установка ванного каркаса и ванной	15.10.2012	20.10.2012
Мраморная отделка пола	19.10.2012	23.10.2012
Установка деревянного ламбрекена	17.10.2012	20.10.2012
Установка встроенной мебели, панели	21.10.2012	30.10.2012
Установка дверной рамы и панели	31.10.2012	04.11.2012
Установка мрамора на ванный каркас	02.11.2012	06.11.2012
Завершение зашивки инженерных систем	27.10.2012	27.10.2012
Установка гипсокартонного потолка	28.10.2012	02.11.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	03.11.2012	12.11.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	13.11.2012	17.11.2012
Ковровое покрытие	11.11.2012	16.11.2012
Установка штор	15.11.2012	18.11.2012
Установка санитарного оборудования	14.11.2012	20.11.2012
Handover of room ons 7/F (DK 3rms)	**12.10.2012**	**25.11.2012**
Установка швеллера для стеклянной кабины	12.10.2012	14.10.2012
Установка потолочной рамы	12.10.2012	16.10.2012
Установка мрамора и мозаики	15.10.2012	24.10.2012
Установка ванного каркаса и ванной	20.10.2012	25.10.2012
Мраморная отделка пола	25.10.2012	29.10.2012
Установка деревянного ламбрекена	23.10.2012	26.10.2012
Установка встроенной мебели, панели	27.10.2012	05.11.2012
Установка дверной рамы и панели	06.11.2012	10.11.2012
Установка мрамора на ванный каркас	08.11.2012	12.11.2012
Завершение зашивки инженерных систем	01.11.2012	01.11.2012
Установка гипсокартонного потолка	02.11.2012	07.11.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	08.11.2012	17.11.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	18.11.2012	22.11.2012
Ковровое покрытие	16.11.2012	21.11.2012
Установка штор	20.11.2012	23.11.2012
Установка санитарного оборудования	19.11.2012	25.11.2012
Мебелировка	**26.11.2012**	**31.01.2013**
Мебелировка	26.11.2012	31.01.2013
Этаж на отметке +26.850	**20.08.2010**	**20.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	20.08.2010	19.09.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	20.08.2010	19.09.2010
Устройство перекрытий	20.08.2010	18.09.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	20.08.2010	13.09.2010
Устройство лестничных маршей	20.08.2010	25.09.2010
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
8/F (KA,KB&TR 13 rms) Installation	**14.09.2012**	**10.11.2012**
Установка встроенной мебели, панели	14.09.2012	25.09.2012
Установка дверной рамы и панели	26.09.2012	05.10.2012
Установка мрамора на ванный каркас	04.10.2012	09.10.2012
Завершение зашивки инженерных систем	05.10.2012	05.10.2012
Установка гипсокартонного потолка	06.10.2012	13.10.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	14.10.2012	23.10.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	24.10.2012	30.10.2012
Ковровое покрытие	29.10.2012	05.11.2012
Установка штор	03.11.2012	07.11.2012
Установка санитарного оборудования	02.11.2012	10.11.2012
Handover of room ons 8/F (KC&KD 3rms)	**30.09.2012**	**13.11.2012**
Установка швеллера для стеклянной кабины	30.09.2012	02.10.2012
Установка потолочной рамы	30.09.2012	04.10.2012
Установка мрамора и мозаики	03.10.2012	12.10.2012
Установка ванного каркаса и ванной	09.10.2012	14.10.2012
Мраморная отделка пола	13.10.2012	17.10.2012
Установка деревянного ламбрекена	11.10.2012	14.10.2012
Установка встроенной мебели, панели	15.10.2012	24.10.2012
Установка дверной рамы и панели	25.10.2012	29.10.2012
Установка мрамора на ванный каркас	27.10.2012	31.10.2012
Завершение зашивки инженерных систем	20.10.2012	20.10.2012
Установка гипсокартонного потолка	21.10.2012	26.10.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	27.10.2012	05.11.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	06.11.2012	10.11.2012
Ковровое покрытие	04.11.2012	09.11.2012
Установка штор	08.11.2012	11.11.2012
Установка санитарного оборудования	07.11.2012	13.11.2012
Handover of room ons 8/F (DK 3rms)	**12.10.2012**	**25.11.2012**
Установка швеллера для стеклянной кабины	12.10.2012	14.10.2012
Установка потолочной рамы	12.10.2012	16.10.2012
Установка мрамора и мозаики	15.10.2012	24.10.2012
Установка ванного каркаса и ванной	20.10.2012	25.10.2012
Мраморная отделка пола	25.10.2012	29.10.2012
Установка деревянного ламбрекена	23.10.2012	26.10.2012
Установка встроенной мебели, панели	27.10.2012	05.11.2012
Установка дверной рамы и панели	06.11.2012	10.11.2012
Установка мрамора на ванный каркас	08.11.2012	12.11.2012
Завершение зашивки инженерных систем	01.11.2012	01.11.2012
Установка гипсокартонного потолка	02.11.2012	07.11.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	08.11.2012	17.11.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	18.11.2012	22.11.2012
Ковровое покрытие	16.11.2012	21.11.2012
Установка штор	20.11.2012	23.11.2012
Установка санитарного оборудования	19.11.2012	25.11.2012
Мебелировка	**26.11.2012**	**31.01.2013**
Мебелировка	26.11.2012	31.01.2013
Этаж на отметке +30.450	**04.09.2010**	**20.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	04.09.2010	05.09.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	04.09.2010	29.09.2010
Устройство перекрытий	04.09.2010	29.09.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	04.09.2010	28.09.2010
Устройство лестничных маршей	04.09.2010	03.10.2010
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
9/F (KA,KB&TR 13 rms) Installation	**09.09.2012**	**05.11.2012**
Установка встроенной мебели, панели	09.09.2012	20.09.2012
Установка дверной рамы и панели	21.09.2012	30.09.2012
Установка мрамора на ванный каркас	29.09.2012	04.10.2012
Завершение зашивки инженерных систем	30.09.2012	30.09.2012
Установка гипсокартонного потолка	01.10.2012	08.10.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	09.10.2012	18.10.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	19.10.2012	25.10.2012
Ковровое покрытие	24.10.2012	31.10.2012
Установка штор	29.10.2012	02.11.2012
Установка санитарного оборудования	28.10.2012	05.11.2012
Handover of room ons 9/F (KC&KD 3rms)	**23.09.2012**	**07.11.2012**
Установка швеллера для стеклянной кабины	24.09.2012	26.09.2012
Установка потолочной рамы	23.09.2012	27.09.2012
Установка мрамора и мозаики	27.09.2012	06.10.2012

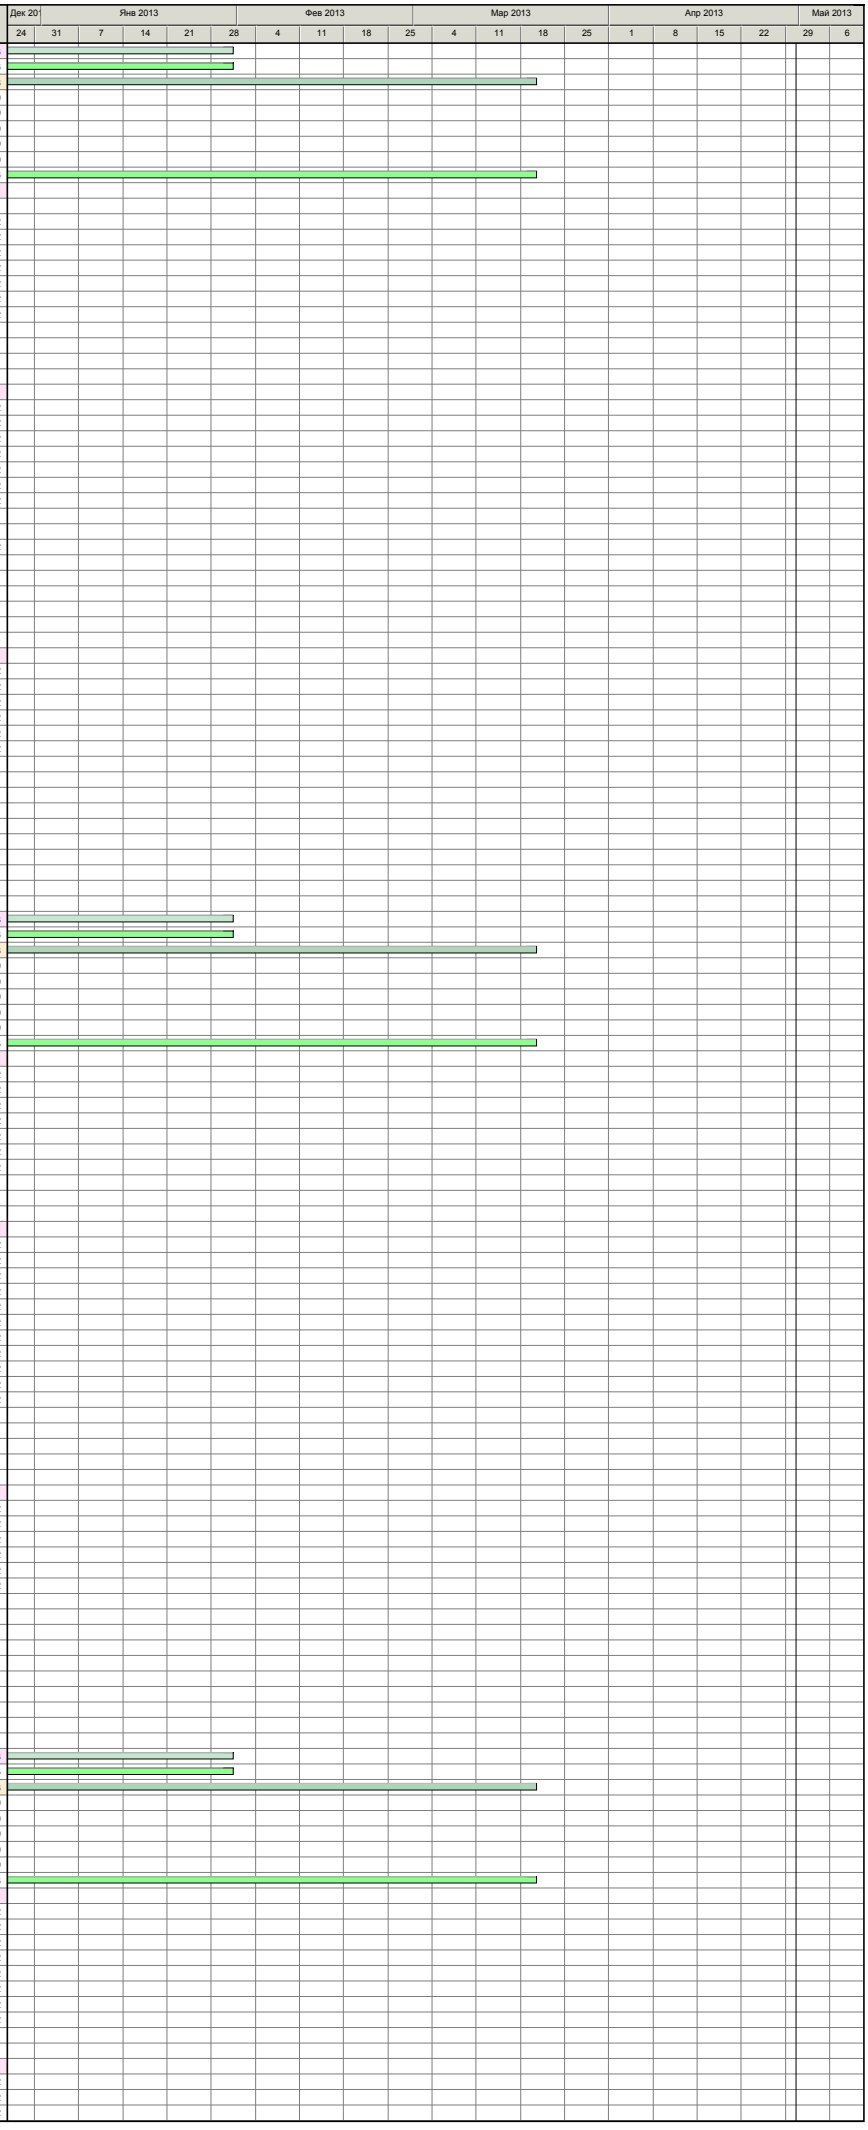

Название	Начало	Окончание
Установка ванного каркаса и ванной	02.10.2012	07.10.2012
Мраморная отделка пола	07.10.2012	11.10.2012
Установка деревянного ламбрекена	05.10.2012	08.10.2012
Установка встроенной мебели, панели	09.10.2012	18.10.2012
Установка дверной рамы и панели	19.10.2012	23.10.2012
Установка мрамора на ванный каркас	17.10.2012	21.10.2012
Завершение зашивки инженерных систем	14.10.2012	14.10.2012
Установка гипсокартонного потолка	15.10.2012	20.10.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	21.10.2012	30.10.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	31.10.2012	04.11.2012
Ковровое покрытие	29.10.2012	03.11.2012
Установка штор	02.11.2012	05.11.2012
Установка санитарного оборудования	01.11.2012	07.11.2012
Handover of room ons 9/F (DK 3rms)	**23.09.2012**	**07.11.2012**
Установка швеллера для стеклянной кабины	24.09.2012	26.09.2012
Установка потолочной рамы	23.09.2012	27.09.2012
Установка мрамора и мозаики	27.09.2012	06.10.2012
Установка ванного каркаса и ванной	02.10.2012	07.10.2012
Мраморная отделка пола	07.10.2012	11.10.2012
Установка деревянного ламбрекена	05.10.2012	08.10.2012
Установка встроенной мебели, панели	09.10.2012	18.10.2012
Установка дверной рамы и панели	19.10.2012	23.10.2012
Установка мрамора на ванный каркас	17.10.2012	21.10.2012
Завершение зашивки инженерных систем	14.10.2012	14.10.2012
Установка гипсокартонного потолка	15.10.2012	20.10.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	21.10.2012	30.10.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	31.10.2012	04.11.2012
Ковровое покрытие	29.10.2012	03.11.2012
Установка штор	02.11.2012	05.11.2012
Установка санитарного оборудования	01.11.2012	07.11.2012
Мебелировка	**08.11.2012**	**15.01.2013**
Мебелировка	08.11.2012	15.01.2013
Этаж на отметке +34.050	**17.09.2010**	**20.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	17.09.2010	09.10.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	17.09.2010	09.10.2010
Устройство перекрытий	17.09.2010	09.10.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	17.09.2010	11.10.2010
Устройство лестничных маршей	17.09.2010	11.10.2010
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
10/F (KA,KB&TR 13 rms) Installation	**06.09.2012**	**31.10.2012**
Установка встроенной мебели, панели	06.09.2012	15.09.2012
Установка дверной рамы и панели	12.09.2012	25.09.2012
Установка мрамора на ванный каркас	24.09.2012	29.09.2012
Завершение зашивки инженерных систем	25.09.2012	25.09.2012
Установка гипсокартонного потолка	26.09.2012	03.10.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	04.10.2012	13.10.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	14.10.2012	20.10.2012
Ковровое покрытие	19.10.2012	26.10.2012
Установка штор	24.10.2012	28.10.2012
Установка санитарного оборудования	23.10.2012	31.10.2012
Handover of room ons 10/F (KC&KD 3rms)	**12.09.2012**	**29.10.2012**
Установка швеллера для стеклянной кабины	12.09.2012	19.09.2012
Установка потолочной рамы	19.09.2012	23.09.2012
Установка мрамора и мозаики	20.09.2012	29.09.2012
Установка ванного каркаса и ванной	25.09.2012	30.09.2012
Мраморная отделка пола	30.09.2012	04.10.2012
Установка деревянного ламбрекена	28.09.2012	01.10.2012
Установка встроенной мебели, панели	02.10.2012	11.10.2012
Установка дверной рамы и панели	12.10.2012	16.10.2012
Установка мрамора на ванный каркас	14.10.2012	18.10.2012
Завершение зашивки инженерных систем	06.10.2012	06.10.2012
Установка гипсокартонного потолка	07.10.2012	12.10.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	13.10.2012	22.10.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	23.10.2012	27.10.2012
Ковровое покрытие	21.10.2012	26.10.2012
Установка штор	24.10.2012	27.10.2012
Установка санитарного оборудования	23.10.2012	29.10.2012
Handover of room ons 10/F (DK 3rms)	**23.09.2012**	**07.11.2012**
Установка швеллера для стеклянной кабины	24.09.2012	26.09.2012
Установка потолочной рамы	23.09.2012	27.09.2012
Установка мрамора и мозаики	27.09.2012	06.10.2012
Установка ванного каркаса и ванной	02.10.2012	07.10.2012
Мраморная отделка пола	07.10.2012	11.10.2012
Установка деревянного ламбрекена	05.10.2012	08.10.2012
Установка встроенной мебели, панели	09.10.2012	18.10.2012
Установка дверной рамы и панели	19.10.2012	23.10.2012
Установка мрамора на ванный каркас	17.10.2012	21.10.2012
Завершение зашивки инженерных систем	14.10.2012	14.10.2012
Установка гипсокартонного потолка	15.10.2012	20.10.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	21.10.2012	30.10.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	31.10.2012	04.11.2012
Ковровое покрытие	29.10.2012	03.11.2012
Установка штор	02.11.2012	05.11.2012
Установка санитарного оборудования	01.11.2012	07.11.2012
Мебелировка	**08.11.2012**	**15.01.2013**
Мебелировка	08.11.2012	15.01.2013
Этаж на отметке +37.650	**27.09.2010**	**20.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	27.09.2010	19.10.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	27.09.2010	19.10.2010
Устройство перекрытий	27.09.2010	19.10.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	27.09.2010	29.09.2010
Устройство лестничных маршей	27.09.2010	21.10.2010
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
11/F (KA,KB&TR 13 rms) Installation	**06.09.2012**	**26.10.2012**
Установка настенной панели	06.09.2012	10.09.2012
Установка дверной рамы и панели	13.09.2012	22.09.2012
Установка мрамора на ванный каркас	21.09.2012	26.09.2012
Завершение зашивки инженерных систем	20.09.2012	21.09.2012
Установка гипсокартонного потолка	21.09.2012	28.09.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	29.09.2012	08.10.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	09.10.2012	15.10.2012
Ковровое покрытие	14.10.2012	21.10.2012
Установка штор	19.10.2012	23.10.2012
Установка санитарного оборудования	18.10.2012	26.10.2012
11/F (KC,KD 3 rms) Installation	**11.09.2012**	**23.10.2012**
Установка швеллера для стеклянной кабины	11.09.2012	13.09.2012
Установка потолочной рамы	13.09.2012	17.09.2012
Установка мрамора и мозаики	14.09.2012	23.09.2012
Установка ванного каркаса и ванной	19.09.2012	24.09.2012
Мраморная отделка пола	24.09.2012	28.09.2012
Установка деревянного ламбрекена	22.09.2012	25.09.2012
Установка встроенной мебели, панели	27.09.2012	06.10.2012
Установка дверной рамы и панели	07.10.2012	11.10.2012
Установка мрамора на ванный каркас	09.10.2012	13.10.2012
Завершение зашивки инженерных систем	01.10.2012	01.10.2012
Установка гипсокартонного потолка	02.10.2012	07.10.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	08.10.2012	17.10.2012
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	18.10.2012	22.10.2012
Ковровое покрытие	15.10.2012	20.10.2012
Установка штор	18.10.2012	21.10.2012
Установка санитарного оборудования	17.10.2012	23.10.2012
Handover of room ons 11/F (DK 3rms)	**23.09.2012**	**07.11.2012**
Установка швеллера для стеклянной кабины	24.09.2012	26.09.2012
Установка потолочной рамы	23.09.2012	27.09.2012
Установка мрамора и мозаики	27.09.2012	06.10.2012
Установка ванного каркаса и ванной	02.10.2012	07.10.2012
Мраморная отделка пола	07.10.2012	11.10.2012
Установка деревянного ламбрекена	05.10.2012	08.10.2012
Установка встроенной мебели, панели	09.10.2012	18.10.2012
Установка дверной рамы и панели	19.10.2012	23.10.2012
Установка мрамора на ванный каркас	17.10.2012	21.10.2012
Завершение зашивки инженерных систем	14.10.2012	14.10.2012
Установка гипсокартонного потолка	15.10.2012	20.10.2012
Финишный слой штукатурки, покраска стен и потолка	21.10.2012	30.10.2012

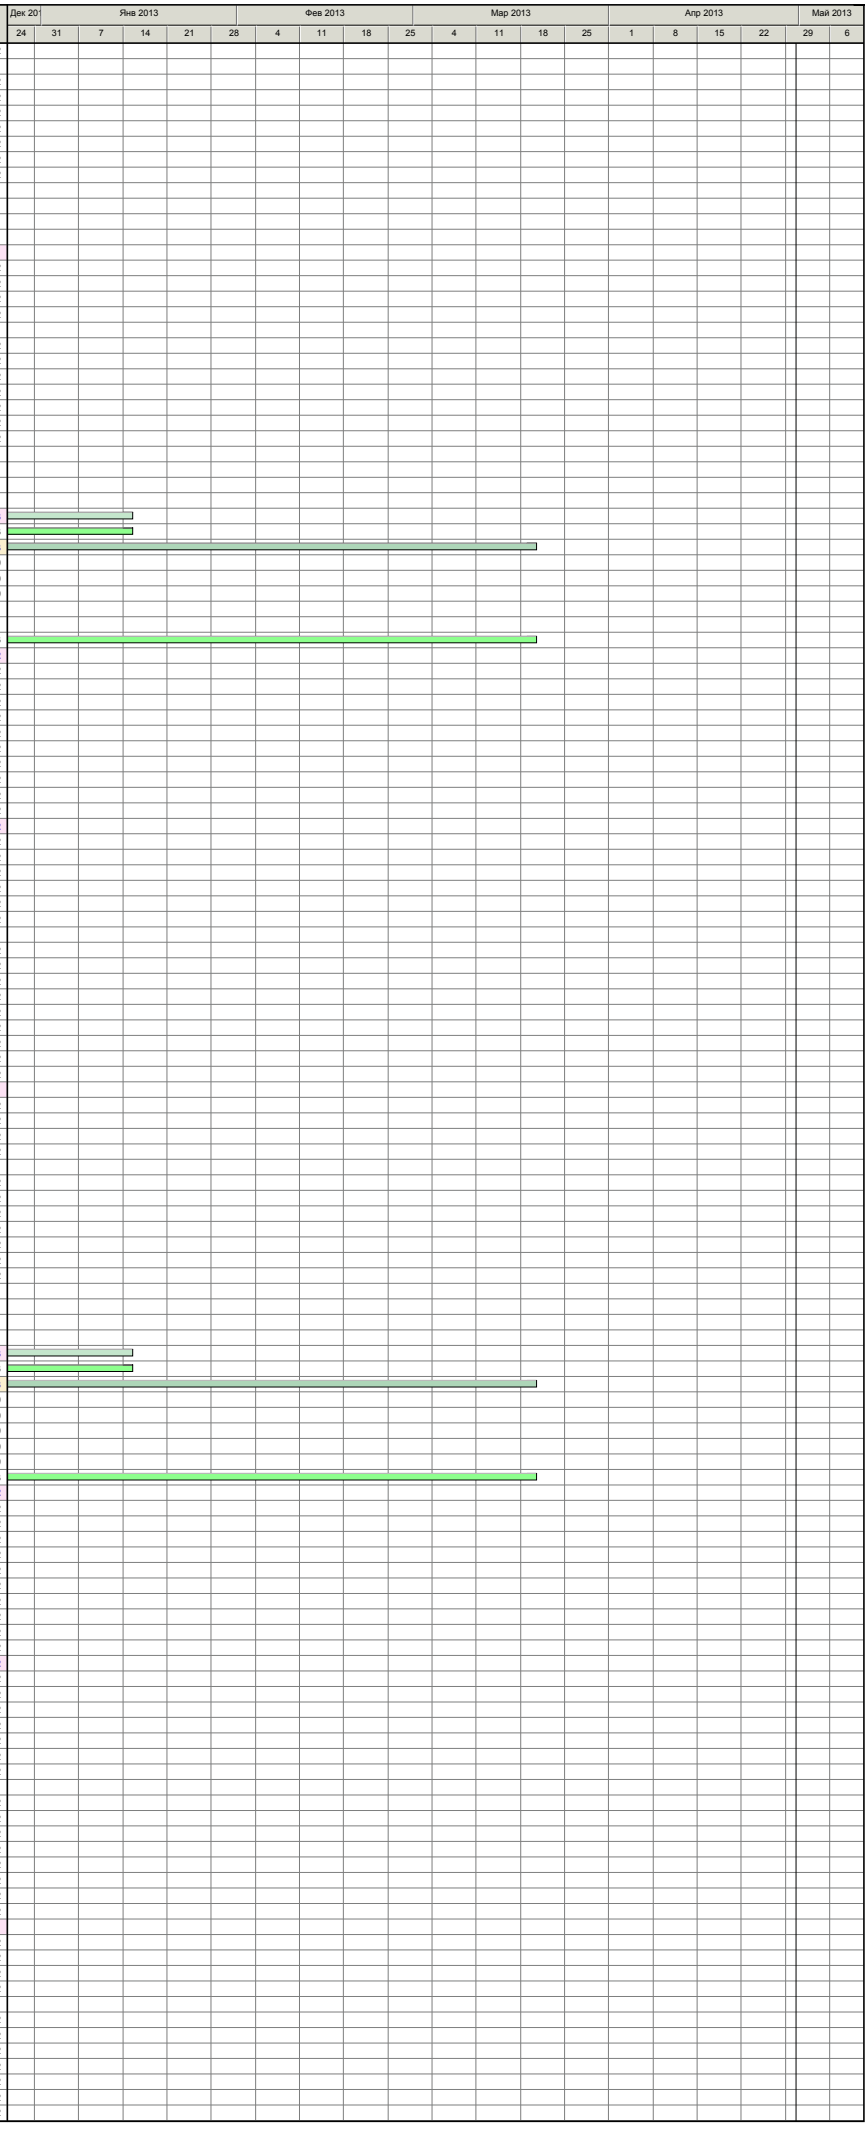

Название	Начало	Окончание
Установка стеклянной перегородки (кабины) и зеркала	31.10.2012	04.11.2012
Ковровое покрытие	29.10.2012	03.11.2012
Установка штор	02.11.2012	05.11.2012
Установка санитарного оборудования	01.11.2012	07.11.2012
Мебелировка	**08.11.2012**	**15.01.2013**
Мебелировка	08.11.2012	15.01.2013
Этаж на отметке +41.250	**06.10.2010**	**20.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	06.10.2010	28.10.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	06.10.2010	28.10.2010
Устройство перекрытий	06.10.2010	28.10.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	06.10.2010	08.10.2010
Устройство лестничных маршей	06.10.2010	30.10.2010
Отделочные работы	**08.11.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	08.11.2012	15.01.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**15.01.2013**	**15.03.2013**
Мебелировка	15.01.2013	15.03.2013
Этаж на отметке +44.850	**30.10.2010**	**20.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	30.10.2010	01.12.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	30.10.2010	29.11.2010
Устройство перекрытий	30.10.2010	30.11.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	30.10.2010	01.11.2010
Устройство лестничных маршей	30.10.2010	23.11.2010
Отделочные работы	**08.11.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	08.11.2012	15.01.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**15.01.2013**	**15.03.2013**
Мебелировка	15.01.2013	15.03.2013
Этаж на отметке +48.450	**22.11.2010**	**20.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	22.11.2010	16.12.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	22.11.2010	14.12.2010
Устройство перекрытий	22.11.2010	09.12.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	22.11.2010	13.12.2010
Устройство лестничных маршей	22.11.2010	10.12.2010
Отделочные работы	**08.11.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	08.11.2012	15.01.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**15.01.2013**	**15.03.2013**
Мебелировка	15.01.2013	15.03.2013
Этаж на отметке +52.050	**16.12.2010**	**20.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	16.12.2010	19.01.2011
Устройство железобетонных стен и перегородок	16.12.2010	03.02.2011
Устройство перекрытий	16.12.2010	21.01.2011
Установка закладных деталей весом до 20 кг	16.12.2010	22.12.2010
Устройство лестничных маршей	30.12.2010	13.01.2011
Отделочные работы	**08.11.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	08.11.2012	15.01.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**15.01.2013**	**15.03.2013**
Мебелировка	15.01.2013	15.03.2013
Отметка +55.650	**31.01.2011**	**01.04.2011**
Устройство перекрытий	31.01.2011	01.04.2011
Установка закладных деталей весом до 20 кг	31.01.2011	01.04.2011
Конференц-зал	**01.06.2010**	**21.03.2013**
Этаж на отметке -4.600	**01.06.2010**	**21.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	01.06.2010	25.09.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	01.06.2010	30.10.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	01.06.2010	01.06.2010
Устройство лестничных маршей	01.09.2010	13.09.2010
Отделочные работы	**03.12.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	03.12.2012	21.01.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**21.01.2013**	**21.03.2013**
Мебелировка	21.01.2013	21.03.2013
Этаж на отметке -0.150	**06.09.2010**	**21.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	06.09.2010	04.10.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	06.09.2010	03.10.2010
Устройство перекрытий	06.09.2010	02.10.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	25.09.2010	30.09.2010
Устройство лестничных маршей	06.09.2010	09.10.2010
Отделочные работы	**03.12.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	03.12.2012	21.01.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**21.01.2013**	**21.03.2013**
Мебелировка	21.01.2013	21.03.2013
Этаж на отметке +4.050	**26.09.2010**	**21.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	26.09.2010	11.10.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	26.09.2010	12.10.2010
Устройство перекрытий	26.09.2010	11.10.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	30.09.2010	03.10.2010
Отделочные работы	**03.12.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	03.12.2012	21.01.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**21.01.2013**	**21.03.2013**
Мебелировка	21.01.2013	21.03.2013
Отметка +7.750	**20.09.2010**	**22.10.2010**
Устройство перекрытий	20.09.2010	22.10.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	20.09.2010	26.09.2010
СПА комплекс	**09.06.2010**	**22.03.2013**
Этаж на отметке -4.600	**09.06.2010**	**22.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	09.06.2010	04.08.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	09.06.2010	04.08.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	09.06.2010	04.08.2010
Устройство лестничных маршей	09.06.2010	04.08.2010
Отделочные работы	**03.12.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	03.12.2012	20.02.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**21.02.2013**	**22.03.2013**
Мебелировка	21.02.2013	22.03.2013
Бассейны	**01.03.2012**	**30.04.2012**
Спортивный бассейн в осях А-Г	**01.03.2012**	**30.04.2012**
Днище бассейна	**01.03.2012**	**30.04.2012**
Армирование	09.03.2012	18.04.2012
Установка опалубки	01.03.2012	02.04.2012
Бетонирование	04.04.2012	30.04.2012
Стенки бассейна	**01.03.2012**	**30.04.2012**
Армирование	05.03.2012	17.04.2012
Установка опалубки	01.03.2012	30.03.2012
Бетонирование	06.04.2012	30.04.2012
Оздоровительный бассейн в осях Д-Ж	**01.03.2012**	**30.04.2012**
Армирование	01.03.2012	04.04.2012
Установка опалубки днища	01.03.2012	28.03.2012
Установка опалубки стенок	28.03.2012	17.04.2012
Бетонирование	30.03.2012	30.04.2012
Детский бассейн в осях Б3-ГЗ	**01.03.2012**	**30.04.2012**
Армирование	01.03.2012	29.03.2012
Установка опалубки днища	01.03.2012	28.03.2012
Установка опалубки стенок	15.03.2012	03.04.2012
Бетонирование	04.04.2012	30.04.2012
Этаж на отметке -0.150	**04.07.2010**	**22.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	04.07.2010	13.08.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	04.07.2010	13.08.2010
Устройство перекрытий	04.07.2010	12.08.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	04.07.2010	13.08.2010
Устройство лестничных маршей	04.07.2010	12.08.2010
Отделочные работы	**03.12.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	03.12.2012	20.02.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**21.02.2013**	**22.03.2013**
Мебелировка	21.02.2013	22.03.2013
Этаж на отметке +4.050	**19.08.2010**	**22.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	19.08.2010	27.09.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	19.08.2010	27.09.2010
Устройство перекрытий	19.08.2010	15.09.2010

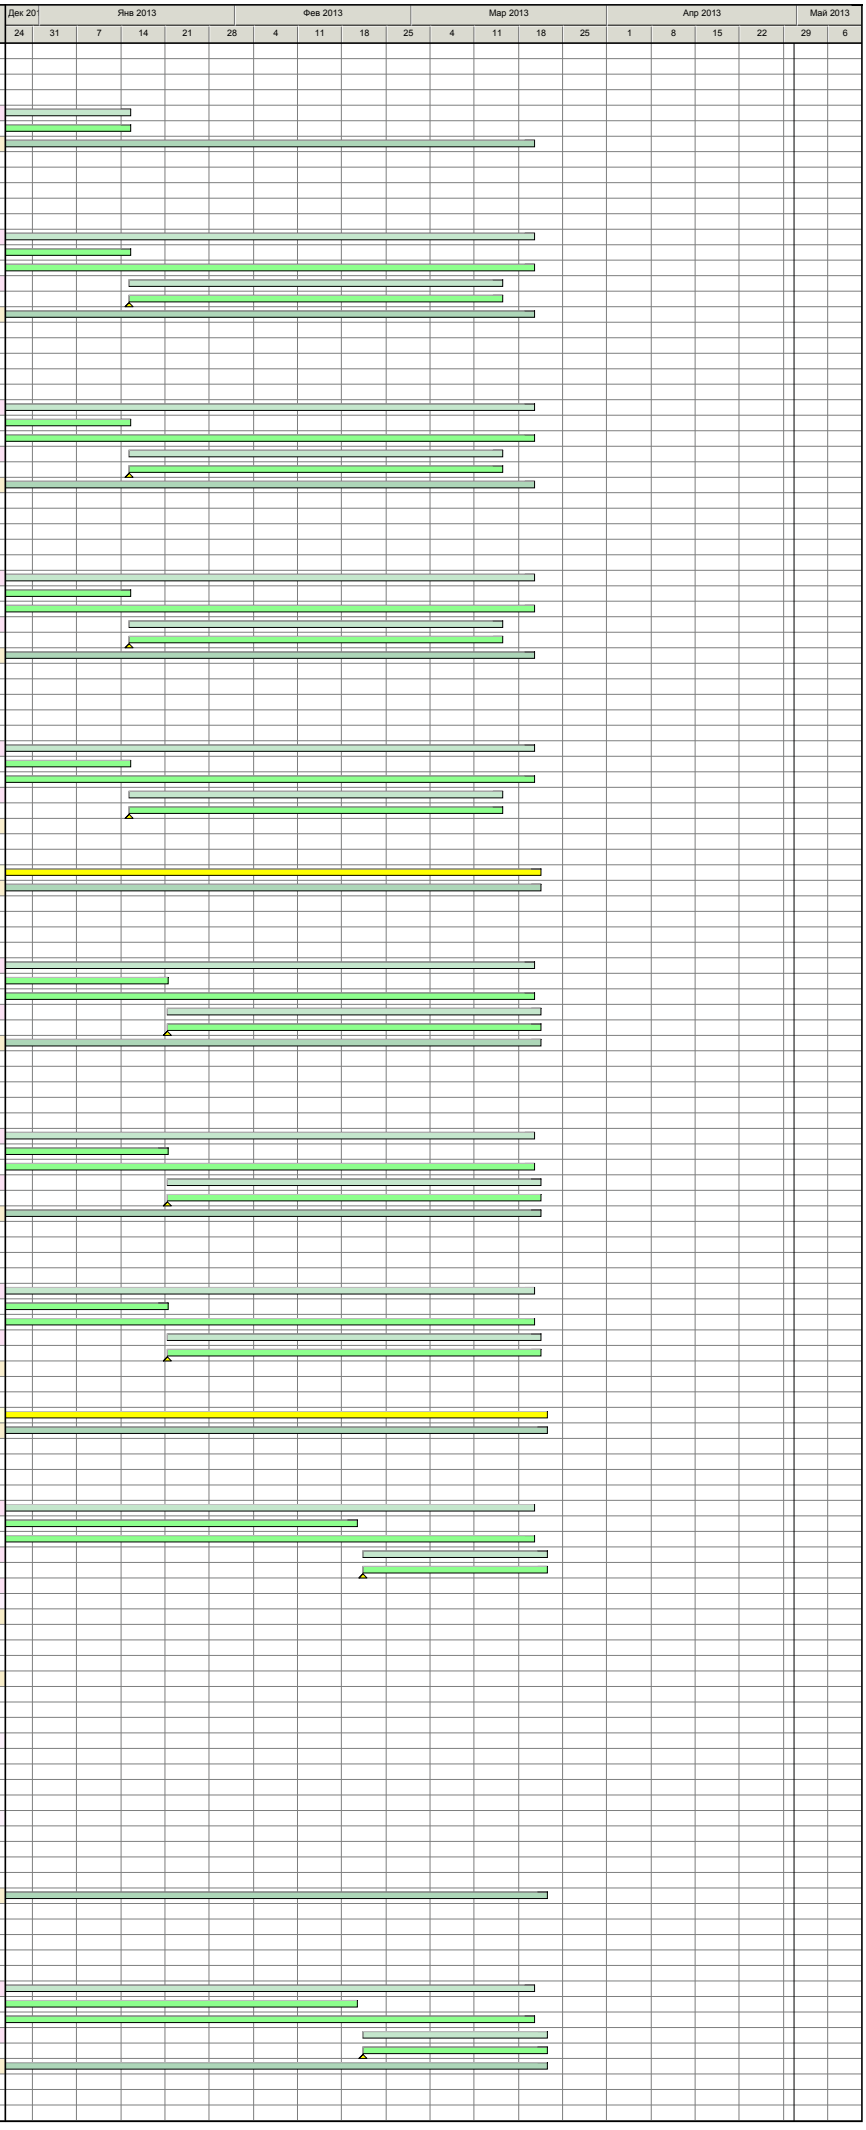

Название	Начало	Окончание
Установка закладных деталей весом до 20 кг	19.08.2010	27.09.2010
Устройство лестничных маршей	19.08.2010	30.08.2010
Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия под бассейн	15.09.2010	18.10.2010
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	19.08.2010	21.09.2010
Отделочные работы	**03.12.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	03.12.2012	20.02.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**21.02.2013**	**22.03.2013**
Мебелировка	21.02.2013	22.03.2013
Этаж на отметке +8.250	**11.10.2010**	**22.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	11.10.2010	16.11.2010
Устройство железобетонных стен и перегородок	11.10.2010	16.11.2010
Устройство перекрытий	11.10.2010	08.02.2011
Установка закладных деталей весом до 20 кг	11.10.2010	12.10.2010
Устройство лестничных маршей	11.10.2010	26.01.2011
Отделочные работы	**03.12.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	03.12.2012	20.02.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**21.02.2013**	**22.03.2013**
Мебелировка	21.02.2013	22.03.2013
Этаж на отметке +11.600	**02.11.2010**	**22.03.2013**
Устройство железобетонных колонн	02.11.2010	04.01.2011
Устройство железобетонных стен и перегородок	02.11.2010	15.12.2010
Устройство перекрытий	02.11.2010	05.12.2010
Установка закладных деталей весом до 20 кг	02.11.2010	03.11.2010
Устройство лестничных маршей	02.11.2010	18.11.2010
Отделочные работы	**03.12.2012**	**20.03.2013**
Отделочные работы	03.12.2012	20.02.2013
Отделка стен коридоров	19.12.2012	20.03.2013
Мебелировка	**21.02.2013**	**22.03.2013**
Мебелировка	21.02.2013	22.03.2013
Отметка +14.950	**18.11.2010**	**01.02.2011**
Устройство перекрытий	18.11.2010	01.02.2011
Установка закладных деталей весом до 20 кг	18.11.2010	01.02.2011
Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания	18.11.2010	01.02.2011
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	18.11.2010	01.02.2011
Скважина	**01.03.2012**	**28.09.2012**
Бурение скважины морской воды	01.03.2012	28.09.2012
Воздушный переход	**02.05.2011**	**12.06.2011**
Монтаж конструкций перехода (ферм Ф1 и Ф2 и прогонов)	02.05.2011	05.06.2011
Монтаж конструкций перехода (рядовые прогоны и связи)	10.05.2011	12.06.2011
Фасад	**01.02.2011**	**30.03.2012**
Монтаж конструкций	01.02.2011	30.03.2012
Стоимость алюминиевых конструкций фасадов	01.02.2011	30.03.2012
Стоимость заполнения алюминиевых конструкций	01.02.2011	30.03.2012
Стоимость алюминиевых окон, балконных дверей	01.02.2011	30.03.2012
Стоимость алюминиевых входных дверей	01.02.2011	30.03.2012
Изоляция изделиями из пенопласта полистирольного на битуме стен	01.02.2011	30.03.2012
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм	01.02.2011	30.03.2012
Обустройство балконов	01.02.2011	30.03.2012
Фасадное освещение	01.02.2011	30.03.2012
Устройство кровли	**01.04.2011**	**30.03.2012**
Здание гостиницы	**01.04.2011**	**30.12.2011**
Технический этаж (на отм. +55.650 (15 этаж))	**01.04.2011**	**30.12.2011**
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	01.04.2011	30.12.2011
Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике	01.04.2011	30.12.2011
Разуклонка из керамзитом (ср. толщ. 155мм)	01.04.2011	30.12.2011
Армирование подстилающих слоев и набетонок (вес 1 м2 сетки 100х100хВр4 - 2 кг.)	01.04.2011	30.12.2011
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	01.04.2011	30.12.2011
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм	01.04.2011	30.12.2011
Огрунтовка оснований из бетона	01.04.2011	30.12.2011
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	01.04.2011	30.12.2011
Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике (до толщ. 30 к=3)	01.04.2011	30.12.2011
Устройство покрытий на цементном растворе	01.04.2011	30.12.2011
Высотная часть (на отм. +48.450 (14 этаж))	**01.04.2011**	**31.10.2011**
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	01.04.2011	31.10.2011
Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике	01.04.2011	31.10.2011
Утепление покрытий керамзитом	01.04.2011	31.10.2011
Армирование подстилающих слоев и набетонок	01.04.2011	31.10.2011
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	01.04.2011	31.10.2011
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм	01.04.2011	31.10.2011
Огрунтовка оснований из бетона	01.04.2011	31.10.2011
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	01.04.2011	31.10.2011
Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике (до толщ. 30 к=3)	01.04.2011	31.10.2011
Устройство покрытий на цементном растворе	01.04.2011	31.10.2011
Конференц-зал (на отм. +8.000)	**01.04.2011**	**22.08.2011**
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	01.04.2011	22.08.2011
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	01.04.2011	22.08.2011
Утепление покрытий плитами	01.04.2011	22.08.2011
Разуклонка из керамзита (ср. толщ. 70мм)	01.04.2011	22.08.2011
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	01.04.2011	22.08.2011
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины	01.04.2011	22.08.2011
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	01.04.2011	22.08.2011
Армирование подстилающих слоев и набетонок	01.04.2011	22.08.2011
Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	01.04.2011	22.08.2011
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	01.04.2011	22.08.2011
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины	01.04.2011	22.08.2011
Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт.	01.04.2011	22.08.2011
Ограждение кровель перилами	01.04.2011	22.08.2011
СПА комплекс	**20.10.2011**	**30.03.2012**
СПА купол (на отм. 15.200)	**26.12.2011**	**30.03.2012**
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	26.12.2011	30.03.2012
Утепление покрытий плитами из пенопласта	26.12.2011	30.03.2012
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	26.12.2011	30.03.2012
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины	26.12.2011	30.03.2012
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	26.12.2011	30.03.2012
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	26.12.2011	30.03.2012
СПА плоская кровля (на отм. +15.200)	**20.10.2011**	**31.01.2012**
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	20.10.2011	31.01.2012
Утепление покрытий плитами из пенопласта	20.10.2011	31.01.2012
Разуклонка из керамзитом (ср. толщ. 155мм)	20.10.2011	31.01.2012
Армирование подстилающих слоев и набетонок (вес 1 м2 сетки 100х100хВр4 - 2 кг.)	20.10.2011	31.01.2012
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	20.10.2011	31.01.2012
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины	20.10.2011	31.01.2012
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	20.10.2011	31.01.2012
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	20.10.2011	31.01.2012
Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике (до толщ. 30 к=3)	20.10.2011	31.01.2012
Устройство покрытий на цементном растворе	20.10.2011	31.01.2012
Воздушный переход (на отм. 12.000)	**17.10.2011**	**28.12.2011**
Заполнение волны профнастила керамзитом	17.10.2011	05.12.2011
Утепление покрытий плитами из пенопласта	17.10.2011	23.12.2011
Утепление покрытий керамзитом	17.10.2011	26.12.2011
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	17.10.2011	23.12.2011
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины	17.10.2011	23.12.2011
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	17.10.2011	23.12.2011
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	17.10.2011	28.12.2011
Устройство внутренних перегородок	**31.08.2011**	**13.04.2012**
Кладка перегородок из кирпича армированных	31.08.2011	20.03.2012
Кладка стен из легкобетонных блоков без облицовки при высоте этажа до 4 м	31.08.2011	13.04.2012
Устройство перегородок из ГКЛ	31.08.2011	13.04.2012
Инженерные системы	**29.08.2011**	**05.03.2013**
Монтаж системы электрики	15.11.2012	11.02.2013
Монтаж ТП	15.11.2012	11.02.2013
Получение разрешения на пуско-наладку ТП	29.10.2012	30.11.2012
Получение разрешения на постоянное подключение к электросетям	11.02.2013	05.03.2013
Монтаж вентиляционной системы	29.08.2011	01.03.2013
Монтаж шинопровода	05.01.2013	31.01.2013
Технические системы безопасности	**30.09.2011**	**28.02.2013**
Монтаж системы пожарной сигнализации	30.09.2011	28.02.2013
Монтаж пожарного водовода	30.09.2011	25.02.2013
Проведение экспертизы пожарной безопасности	20.11.2012	14.12.2012
Структурированная кабельная сеть	**20.12.2011**	**15.02.2013**
Монтаж системы передачи данных	20.12.2011	15.02.2013
Системы управления гостиницей	**15.12.2011**	**20.02.2013**

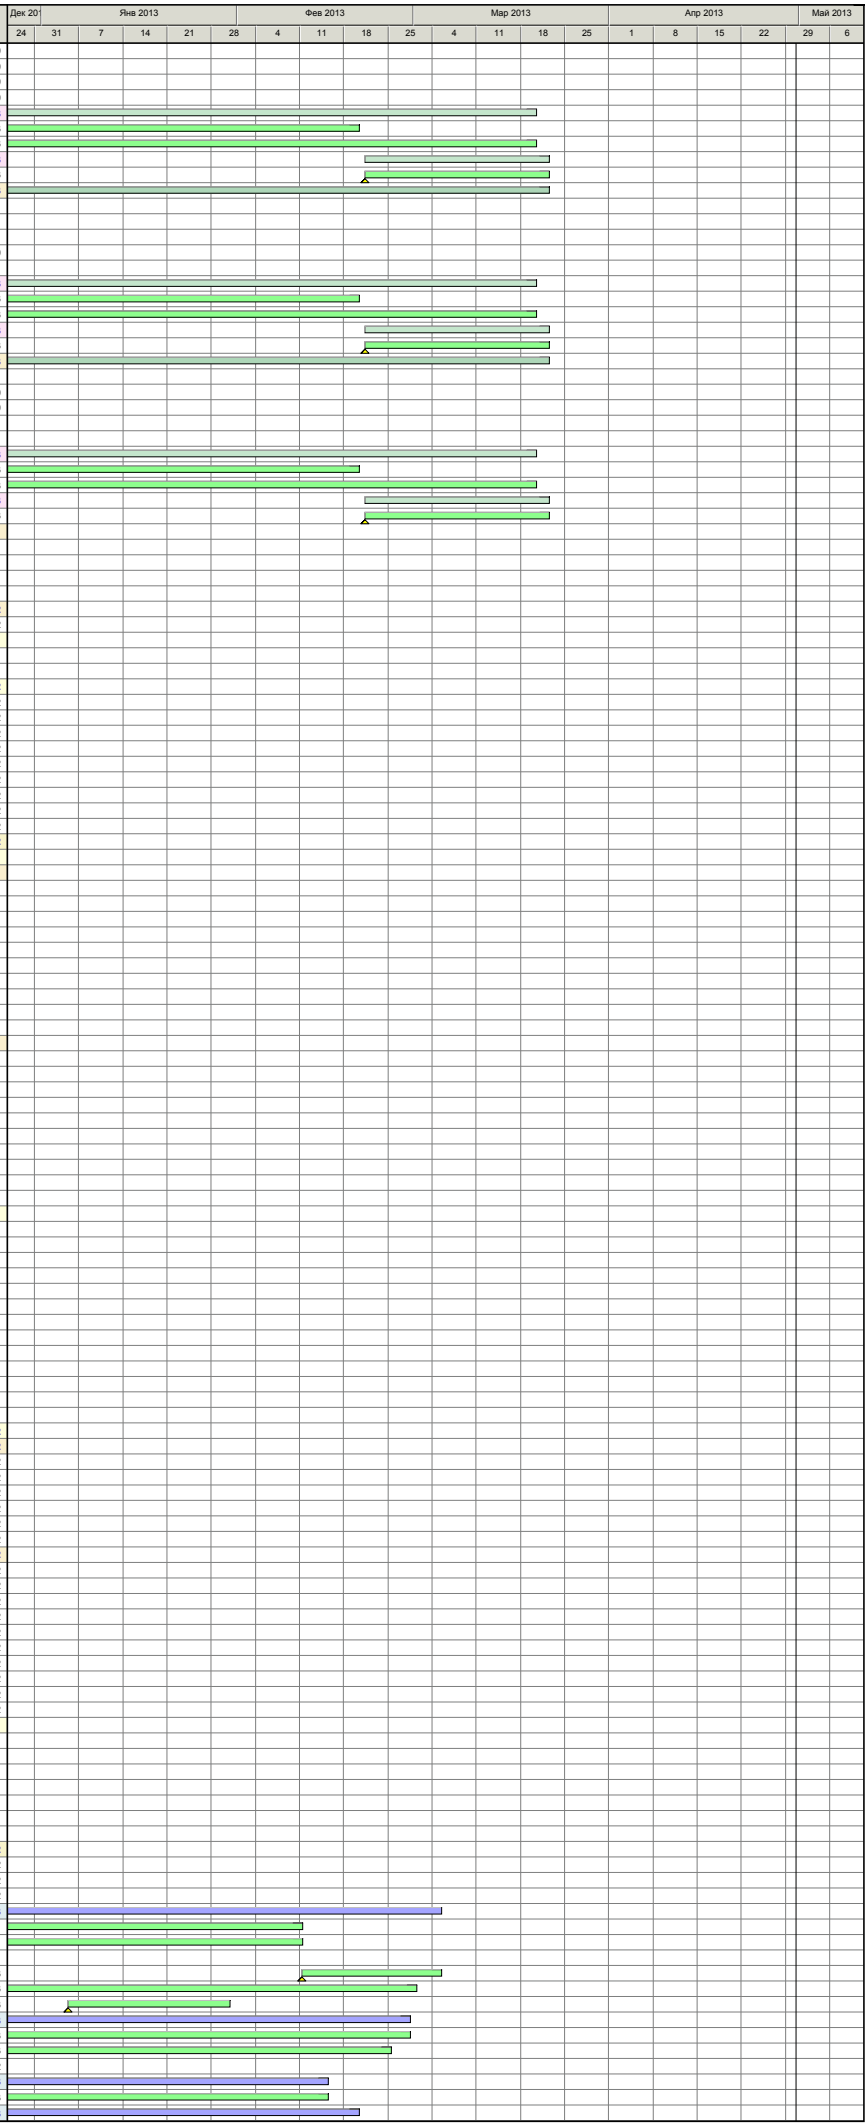

Название	Начало	Окончание
Монтаж АСУ	16.12.2011	20.02.2013
Монтаж системы беспроводной передачи данных	15.12.2011	15.02.2013
Система телефонизации	**16.11.2011**	**20.03.2013**
Монтаж системы телефонизации	16.11.2011	18.03.2013
Монтаж аудио-видео систем	16.11.2011	20.03.2013
Система коллективного приема телевидения	**16.11.2011**	**25.03.2013**
Монтаж системы ТВ	16.11.2011	25.03.2013
Монтаж интерактивного телевидения	16.11.2011	15.03.2013
Подъемно-транспортное оборудование	**08.07.2011**	**25.02.2013**
Покупка оборудования	**08.07.2011**	**22.02.2012**
Покупка пассажирских лифтов	**30.11.2011**	**22.02.2012**
Пассажирский лифт Л1грузоподъёмность 1000кг.	30.11.2011	22.02.2012
Пассажирский лифт Л2, грузоподъёмность 1000кг.	30.11.2011	22.02.2012
Панорамный лифт Л4, грузоподъёмность 630кг.	30.11.2011	22.02.2012
Лифт для перевозки пож. подразделений Л11, грузоподъёмность 1000кг.	30.11.2011	22.02.2012
Пассажирский лифт Л11.1 , грузоподъёмность 1000кг.,	30.11.2011	22.02.2012
Пассажирский лифт Л12 , грузоподъёмность 1000кг.	30.11.2011	22.02.2012
Пассажирский лифт Л 12.1, для инвалидов, грузоподъёмность 1000кг.	30.11.2011	22.02.2012
Покупка грузо- пассажирских лифтов	**08.07.2011**	**30.09.2011**
Грузо-пассажирский лифт Л3, грузоподъёмность 1600кг.	08.07.2011	30.09.2011
Грузовой лифт Л6 (не еда), грузоподъёмность 1600кг.	08.07.2011	30.09.2011
Грузовой лифт Л7 (еда), грузоподъёмность 1000кг.	08.07.2011	30.09.2011
Грузовой лифт Л8 (чистое белье), грузоподъёмность 450кг.	08.07.2011	30.09.2011
Грузовой лифт Л9 (полуфабрикаты), грузоподъёмность 1000кг.	08.07.2011	30.09.2011
Грузовой лифт Л10 (отходы), грузоподъёмность 550кг.	08.07.2011	30.09.2011
Монтажные работы	**19.09.2011**	**25.02.2013**
Монтаж пассажирских лифтов	**03.02.2012**	**07.02.2013**
Монтаж и пуско-наладка Пассажирский лифт Л1	03.02.2012	07.02.2013
Монтаж и пуско-наладка Пассажирский лифт Л2	03.02.2012	07.02.2013
Монтаж и пуско-наладка Пассажирский лифт Л4	03.02.2012	07.02.2013
Монтаж и пуско-наладка Пассажирский лифт Л11	03.02.2012	07.02.2013
Монтаж и пуско-наладка Пассажирский лифт Л11.1	03.02.2012	07.02.2013
Монтаж и пуско-наладка Пассажирский лифт Л12	03.02.2012	07.02.2013
Монтаж и пуско-наладка Пассажирский лифт Л12 .1	03.02.2012	07.02.2013
Монтаж грузо- пассажирских лифтов	**19.09.2011**	**15.02.2013**
Монтаж и пуско-наладка Грузо-пассажирский лифт Л3	19.09.2011	15.02.2013
Монтаж и пуско-наладка Грузо-пассажирский лифт Л10	19.09.2011	15.02.2013
Монтаж и пуско-наладка Грузо-пассажирский лифт Л6	19.09.2011	15.02.2013
Монтаж и пуско-наладка Грузо-пассажирский лифт Л7	19.09.2011	15.02.2013
Монтаж и пуско-наладка Грузо-пассажирский лифт Л8	19.09.2011	15.02.2013
Монтаж и пуско-наладка Грузо-пассажирский лифт Л9	19.09.2011	15.02.2013
Экспертиза	**31.10.2012**	**25.02.2013**
Проведение экспертизы	31.10.2012	25.02.2013
Внутриплощадочные сети и сооружения	**01.09.2011**	**10.03.2013**
Прокладка внутриплощад. сетей водоснабжения	01.09.2011	10.10.2012
Тепловые сети	01.09.2011	21.01.2013
Канализация кабельных систем	23.12.2011	10.10.2012
Прокладка сетей бытовой и производственной кан.	01.09.2011	10.10.2012
Прокладка сетей ливневой канализации	01.09.2011	10.10.2012
Водомерный узел	**10.10.2012**	**08.02.2013**
Монтаж водомерного узла	10.10.2012	25.01.2013
Получение допуска на водоснабжение	28.01.2013	08.02.2013
Индивидуальный тепловой пункт	**25.10.2012**	**10.03.2013**
Монтаж оборудования ИТП	25.10.2012	01.02.2013
Монтаж автоматики ИТП	05.01.2013	20.02.2013
Получение допуска на теплоснабжение	20.02.2013	10.03.2013
Благоустройство	**30.03.2012**	**01.04.2013**
Установка малых архитектурных форм	**28.02.2013**	**01.04.2013**
Монтируемое оборудование	**01.03.2013**	**01.04.2013**
Установка столбиков ограждения (прим.)	01.03.2013	01.04.2013
Установка парковых скамеек (прим.)	01.03.2013	01.04.2013
Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	01.03.2013	01.04.2013
Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	01.03.2013	01.04.2013
Монтаж двойной светодиодной полоски по торцам панелей	01.03.2013	01.04.2013
Не монтируемое оборудование	**28.02.2013**	**01.04.2013**
Установка лежаков пляжных BIVO	28.02.2013	01.04.2013
Установка уличных зонтов DeLux	28.02.2013	01.04.2013
Установка мебели на металлокаркасе (Стол)	28.02.2013	01.04.2013
Установка мебели на металлокаркасе (Кресло)	28.02.2013	01.04.2013
Установка барной стойки <Этника>	28.02.2013	01.04.2013
Установка вазонов садовых	28.02.2013	01.04.2013
Установка урн пепельниц	28.02.2013	01.04.2013
Работы по озеленению прилегающей территории	**01.08.2012**	**29.03.2013**
Посадка газонов	**01.08.2012**	**28.09.2012**
Разбивка участка	01.08.2012	28.09.2012
Подготовка почвы с внесением растительной земли слоем 15 см	01.08.2012	28.09.2012
Подготовка почвы с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	01.08.2012	28.09.2012
Выравнивание толщины слоя торфом	01.08.2012	28.09.2012
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (V=1178,53+438,19)	01.08.2012	28.09.2012
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (V=471,41+175,28)	01.08.2012	28.09.2012
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (V=353,56+131,46)	01.08.2012	28.09.2012
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (V=353,56+131,46)	01.08.2012	28.09.2012
Уход за газонами обыкновенными	01.08.2012	28.09.2012
Посадка деревьев и кустарников	**27.02.2013**	**29.03.2013**
Подготовка стандартных посадочных мест 1,5х1,5х0,65 м механизированным способом	27.02.2013	29.03.2013
Подготовка стандартных посадочных мест 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом	27.02.2013	29.03.2013
Подготовка стандартных посадочных мест 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом	27.02.2013	29.03.2013
Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом	27.02.2013	29.03.2013
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев	27.02.2013	29.03.2013
Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м	27.02.2013	29.03.2013
Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	27.02.2013	29.03.2013
Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	27.02.2013	29.03.2013
Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	27.02.2013	29.03.2013
Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5х0,5 м	27.02.2013	29.03.2013
Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м	27.02.2013	22.03.2013
Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	27.02.2013	22.03.2013
Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	27.02.2013	22.03.2013
Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	27.02.2013	22.03.2013
Уход за саженцами с оголенной корневой системой деревьев	27.02.2013	22.03.2013
Посадка цветников	**28.02.2013**	**29.03.2013**
Огрунтовка оснований под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой	28.02.2013	29.03.2013
Устройство гидроизоляции оклеечной в один слой	28.02.2013	29.03.2013
Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике	28.02.2013	29.03.2013
Устройство выравнивающего слоя из пескоцемента толщ. 0,03-0,1	28.02.2013	29.03.2013
Разуклонка керамзитом	28.02.2013	29.03.2013
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	28.02.2013	29.03.2013
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных	28.02.2013	29.03.2013
Огрунтовка оснований под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой	28.02.2013	29.03.2013
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	28.02.2013	29.03.2013
Устройство подстилающих слоев щебеночных	28.02.2013	29.03.2013
Устройство дренажного слоя: из щебня толщ. 0,10м	28.02.2013	29.03.2013
Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом	28.02.2013	29.03.2013
Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	28.02.2013	29.03.2013
Выравнивание толщины слоя землей	28.02.2013	29.03.2013
Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	28.02.2013	29.03.2013
Уход за цветниками из многолетников	28.02.2013	29.03.2013
Наружное функциональное и ландшафтное освещение	**30.03.2012**	**20.03.2013**
Монтаж и разводка осветительных приборов	30.03.2012	20.03.2013
Дорожные покрытия, тротуары, парковки	**23.04.2012**	**28.09.2012**
Мощение тротуаров, площадок,дороги, подъездов и проездов	**23.04.2012**	**28.09.2012**
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	23.04.2012	28.09.2012
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	23.04.2012	28.09.2012
Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике	23.04.2012	28.09.2012
Разуклонка из керамита (ср. толщ. 70мм)	23.04.2012	28.09.2012
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	23.04.2012	28.09.2012
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	23.04.2012	28.09.2012
Устройство цементобетонных покрытий однослойных	23.04.2012	28.09.2012
Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	23.04.2012	28.09.2012
Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 0,18 м	23.04.2012	28.09.2012
Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе с заполнением швов	23.04.2012	28.09.2012
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	23.04.2012	28.09.2012
Мощение лестницы	**30.04.2012**	**31.05.2012**
Облицовка ступеней гранитными плитами	30.04.2012	31.05.2012
Мощение променада и пожарного проезда на участке	**30.04.2012**	**01.06.2012**

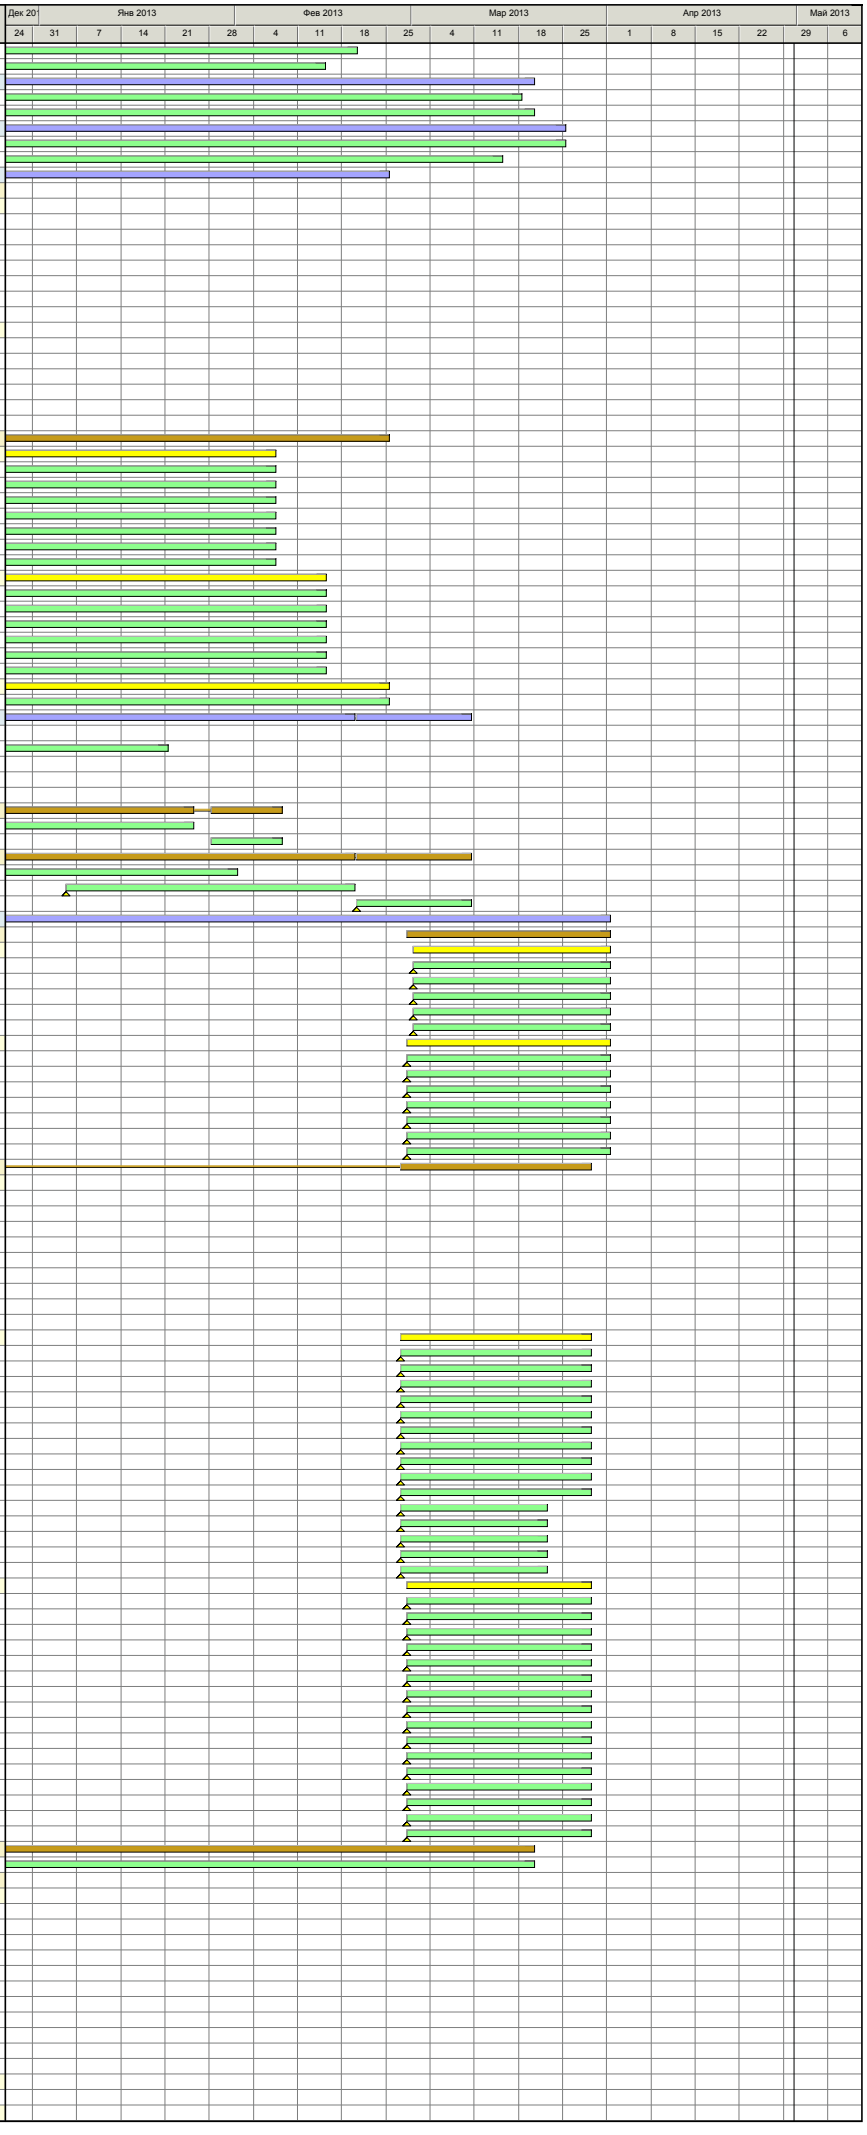

Название	Начало	Окончание
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 0,15 м	30.04.2012	01.06.2012
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 0,10м	30.04.2012	01.06.2012
Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации	30.04.2012	01.06.2012
Устройство покрытий из гранитной плитки	30.04.2012	01.06.2012
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	30.04.2012	01.06.2012
Автомобильная дорога на участке	**30.04.2012**	**28.09.2012**
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	30.04.2012	28.09.2012
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 0.2м	30.04.2012	28.09.2012
Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	30.04.2012	28.09.2012
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	30.04.2012	28.09.2012
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	30.04.2012	28.09.2012
Тротуар на участке	**30.04.2012**	**28.09.2012**
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 0,15	30.04.2012	28.09.2012
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 0,10	30.04.2012	28.09.2012
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных	30.04.2012	28.09.2012
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	30.04.2012	28.09.2012
Отмостка	**30.04.2012**	**01.06.2012**
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 0,20 м	30.04.2012	01.06.2012
Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 0,18 м	30.04.2012	01.06.2012
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	30.04.2012	01.06.2012
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	30.04.2012	01.06.2012
Гранитные валуны	**30.04.2012**	**01.06.2012**
Укладка валунов массой 2000 кг с берега гусеничным краном в закрытой акватории	30.04.2012	01.06.2012
Покупка валунов с доставкой по 7 зоне и загот-складск.	30.04.2012	01.06.2012
Погрузка. Камень естественный без штабелирования	30.04.2012	01.06.2012
Прогулочные дорожки на набережной, на берегозащитных сооружениях	**30.04.2012**	**01.06.2012**
Устройство покрытий из брусчатки	30.04.2012	01.06.2012
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	30.04.2012	01.06.2012
Устройство пляжа	**30.04.2012**	**01.06.2012**
Устройство песчаной подушки с разравниванием (прим.) (V=521,46*0,5)	30.04.2012	01.06.2012
Пуско- наладочные работы	**24.02.2012**	**17.07.2012**
Пусконаладочные работы слаботочных систем	**15.06.2012**	**17.07.2012**
Пуско-наладочные работы по вводу АСУ	15.06.2012	17.07.2012
Пуско-наладочные работы внутриплощадочной системы очистки стоков	**24.02.2012**	**16.04.2012**
Отстойник вертикальный, производительность, м3/сут, до 1600	24.02.2012	16.04.2012
Установка компактная нового поколения	29.02.2012	16.04.2012
Пусконаладка систем водопровода и канализации	**24.02.2012**	**02.04.2012**
1. Пусконаладочные работы системы водоснабжения	**24.02.2012**	**02.04.2012**
Установка перекачки воды	24.02.2012	28.03.2012
Установка бактерицидная	29.02.2012	02.04.2012
Установка бактерицидная	29.02.2012	02.04.2012
2. Пусконаладочные работы системы канализации	**29.02.2012**	**02.04.2012**
Установка перекачки сточных вод, осадка, ила;	29.02.2012	02.04.2012
Пусконаладка систем пожаро-охранной сигнализации и противопожарной защите	**01.06.2012**	**29.06.2012**
АСУ I категории тех. сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 1280 (СПС)	01.06.2012	29.06.2012
АСУ I категории тех. сложности. Система	01.06.2012	29.06.2012
АСУ I категории тех. сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 160 (АПВ)	01.06.2012	29.06.2012
АСУ I категории тех. сложности. Система	01.06.2012	29.06.2012
Ввод объекта в эксплуатацию	**01.02.2013**	**03.04.2013**
Ввод объекта в эксплуатацию	01.02.2013	03.04.2013
Пуско-наладочные работы	**01.03.2013**	**30.04.2013**
Пуско-наладочные работы	01.03.2013	30.04.2013

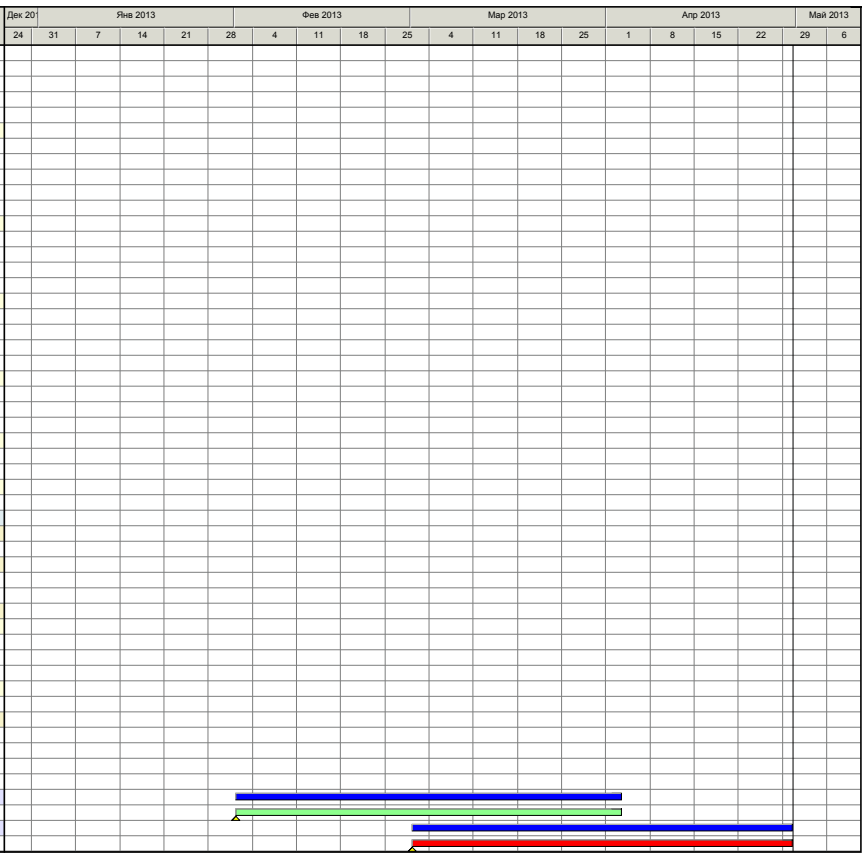

Главный инженер _____В.В. Кислицин

Генеральный директор_____И.И. Вагулин

+2 месяца требуется на обустройство управляющей компании Хаятт
При условии наличия денежных средств.
